



Belastingdienst

Belastingdienst



MT meets Deon

21 maart 2024

14





Agenda

- 1 | Statusupdate planning
- 2 | Statusupdate aantallen
- 3 | Statusupdate burgerrespons




Statusupdate project Deon

Planning

Deon | Planning briefverzending financiële compensatie

In juni wordt nog een restverzending verstuurd van max. 700 BSN's; dit zijn BSN's die betrekking hebben op de giftencasus en nog in onderzoek zijn (CAF-onderzoek)

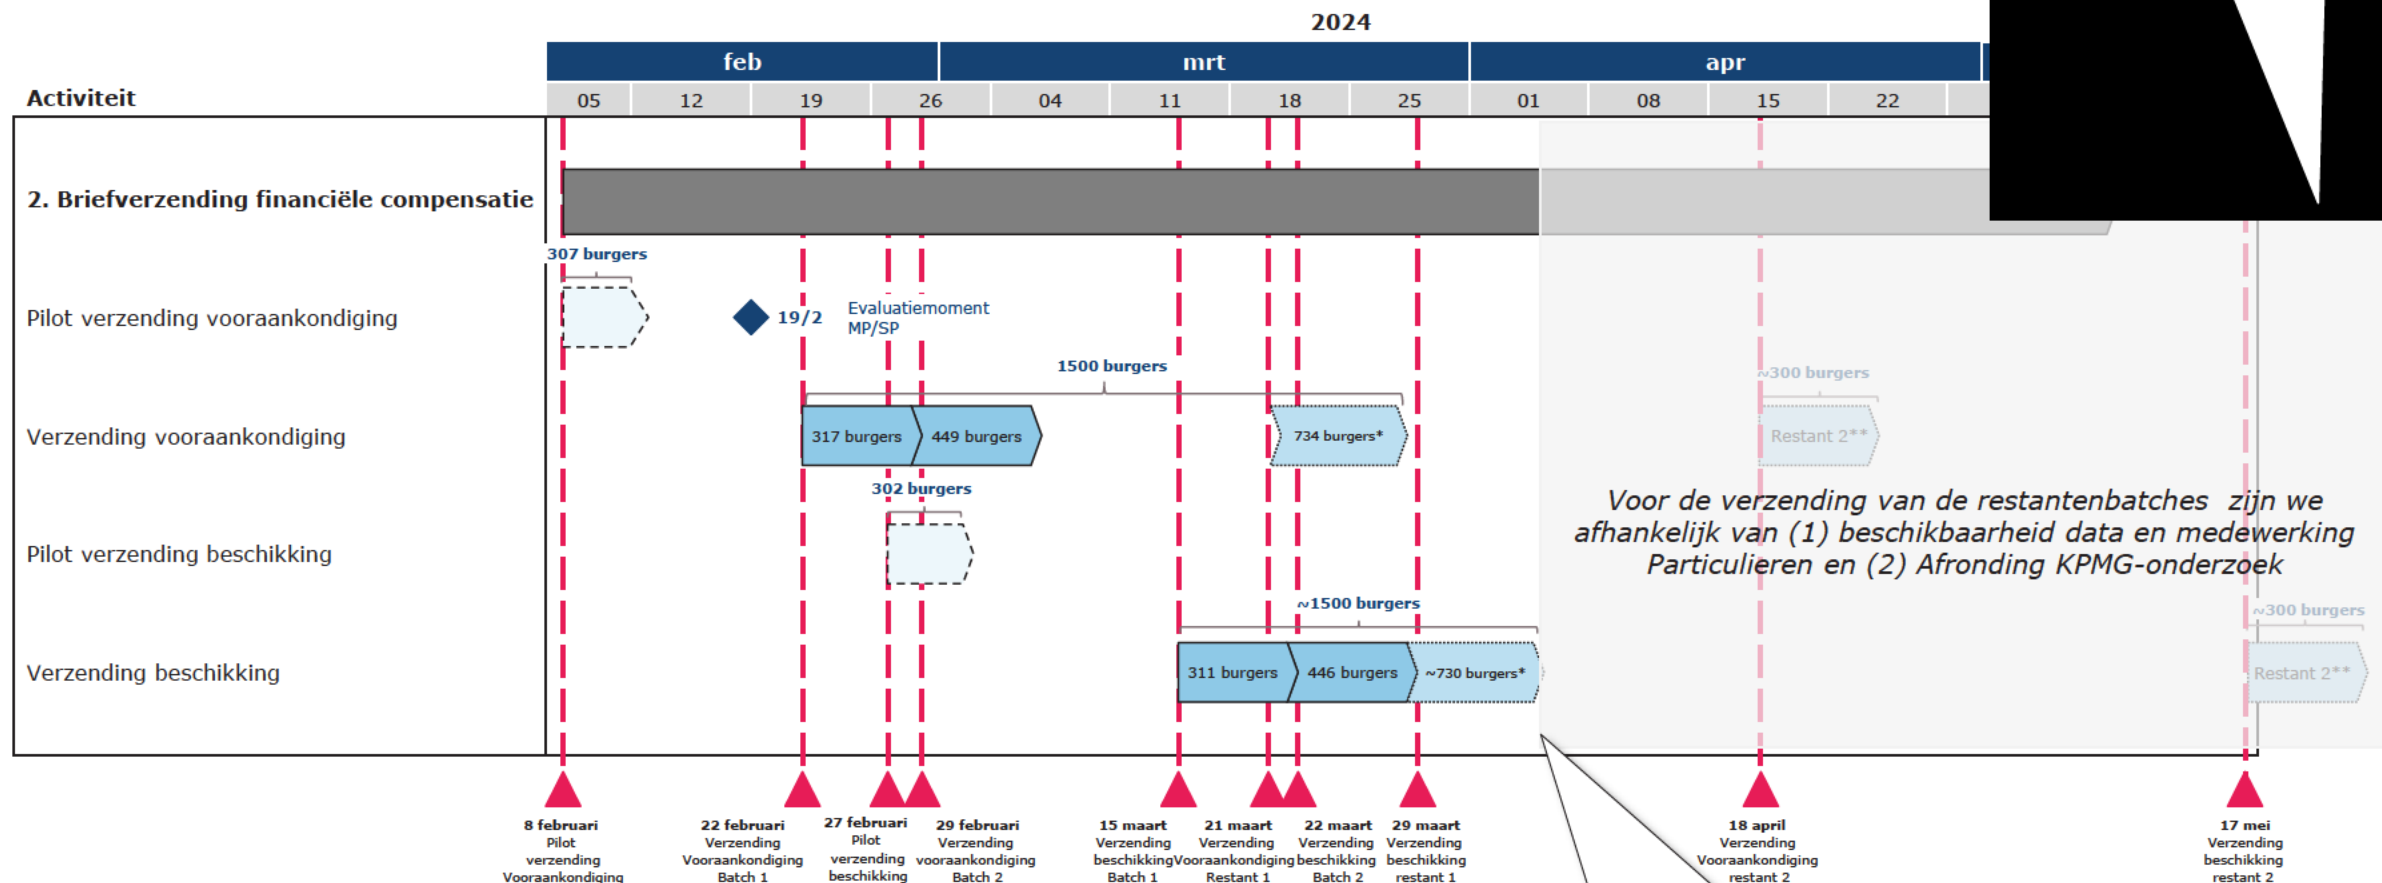


Voor de verzending van de restantenbatches zijn we afhankelijk van (1) beschikbaarheid data en medewerking Particulieren en (2) Afronding KPMG-onderzoek

Op 1 april zullen alle burgers met recht op financiële compensatie, waarvoor de data en onderzoeksresultaten vanuit P op tijd geleverd is, geïnformeerd zijn.

* Restant 1 bestaat uit (1) Burgers die zijn uitgevallen door toepassing communicatiefilters (2) Burgers die in de groep vallen door vervallen van aanvullende fiscale selectiegronden (toegevoegd ná handmatige beoordelingen) en (3) burgers die in de combinatiegroep vallen
 ** Restant 2 bestaat uit: (1) vrijkomende FIOD-registraties en (2) twijfelcasussen (achtergehouden formulieren door Particulieren)



Deon | Planning briefverzending geen financiële compensatie

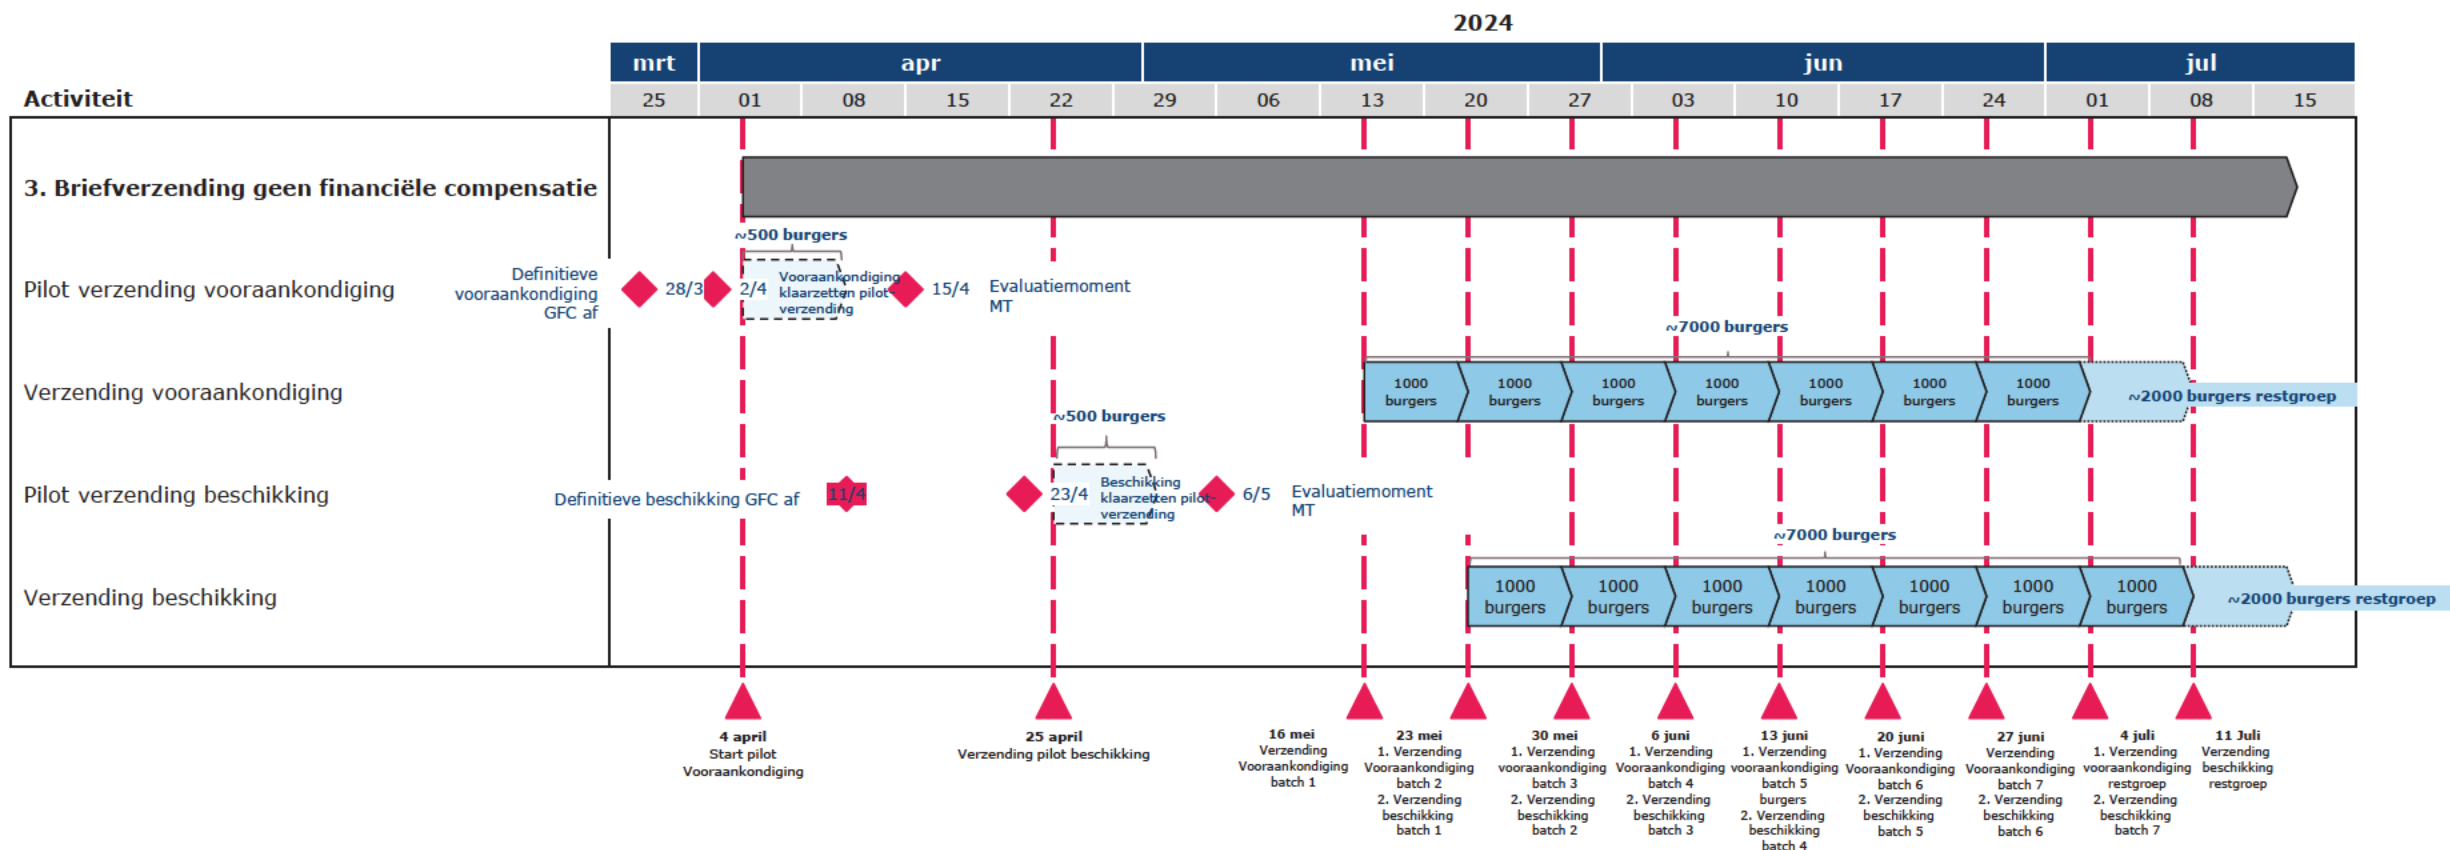

In juni wordt nog een restverzending verstuurd; dit zijn BSN's die betrekking hebben op de giftencasus en nog in onderzoek zijn (CAF-onderzoek)



Statusupdate project Deon

Aantallen



Deon | Briefverzendingen tot heden – originele populatie

Briefsoort	Startpopulatie	Uitval	Verzonden
Financiële compensatie – Vooraankondiging	1.478	355	1.073
Pilot	414	107	307
Batch 1	500	183	317
Batch 2	564	65	449
Financiële compensatie – Beschikking	1.073	14	1.059
Pilot	307	5	302
Batch 1	317	6	311
Batch 2	449	3	446
Totaal	2.551	369	2.132



Deon | Briefverzendingen tot heden –restant groepen

De restant groepen bestaan uit ;

Restant 1

1. Burgers die in de groep vallen door eventueel vervallen aanvullende selectiegronden (toegevoegd ná handmatige beoordelingen)
2. Burgers die zijn uitgevallen door toepassing communicatiefilters
3. Burgers die in de combinatiegroep (wel én geen fiscale gronden) vallen

Restant 2

1. Vrijkomende FIOD-registraties
2. Twijfel casussen (achtergehouden formulieren door Particulieren)

Restant 3

1. Burgers die in de groep vallen doordat hun aangiften gerelateerd zijn aan een giftencasus en onderdeel zijn van het onderzoek van KPMG


Briefsoort	Startpopulatie	Uitval	Verzonden
Financiële compensatie – Vooraankondiging			
Restant 1	Aanvullen	Aanvullen	Aanvullen
Restant 2	~165		
Restant 3	max. ~ 700		
Financiële compensatie – Beschikking			
Restant 1	Aanvullen		
Restant 2			
Restant 3			
Totaal			



Deon | Compensatie wegens selectie a/d poort


- Inmiddels hebben **306 burgers** een compensatie ontvangen
- De huidige schatting qua realisatie komt uit op €9,05 miljoen – dit is lager dan de eerder geprognosticeerde € 15,0 miljoen

AANTALLEN



- De burgers uit de pilotverzending krijgen de compensatie uiterlijk 20 maart 2024 uitbetaald. Betaling is verzonden.
- Aangiften in voorbereiding zitten gedeeltelijk nog in onderzoek – daarom nog geen zekerheid over compensatie.

BEDRAGEN



- Het gemiddelde compensatie bedrag is € 3.620 per gecompenseerde aangifte.
- Het compensatiebedrag voor de aangiften in voorbereiding betreft een schatting.
- De eerder gecommuniceerde prognose betrof € 15 miljoen



Deon | Compensatie wegens selectie a/d poort

Situatie

De eerste betalingen aan de pilotbatch beschikking zijn niet binnen de aangegeven twee weken bij de burger aangekomen.

Consequentie

De belastingdienst heeft met het noemen van een betalingstermijn van twee weken zichzelf een betalingsverplichting opgelegd. Als de BD vervolgens niet tijdig betaalt kan de burger de BD in gebreke stellen.



In ons geval is een ingebrekestelling niet nodig en raakt de Belastingdienst jegens de burger "automatisch" zonder ingebrekestelling in verzuim na het verstrijken van de voor voldoening van de compensatie in de brief van de BD vermelde termijn van twee weken. De burger zou naar aanleiding van de termijnoverschrijding dus ook rechtstreeks en zonder ingebrekestelling kunnen komen met een schadeclaim.

Mitigerende maatregelen

1. In de beschikkingen vanaf batch 3 is de betalingstermijn in de brief aangepast van twee naar zes weken.
2. In de projectplanning is het aanbieden van het betaalbestand aan LIV naar voren gehaald (in dezelfde week als versturen beschikking).
3. Op het portaal is een artikel verschenen waarin het probleem wordt aangekaart en de burger wordt geïnformeerd over wanneer de betaling wel plaats vond.

Aangifte-selectie ☰ Menu Waar b

Vertraging bij uitbetalen van compensatie



Op dit moment is er een vertraging bij de uitbetaling van de financiële compensatie. We zijn bezig het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Als u recht heeft op een compensatie, heeft u hierover een brief van ons ontvangen. Hierin staat dat wij het bedrag binnen twee weken aan u overmaken. Dat is ons binnen deze tijd



Statusupdate project Deon

Burgerrespons



Deon | Burgerrespons

